Hanover St Garage Restoration

Tue 2/27/24
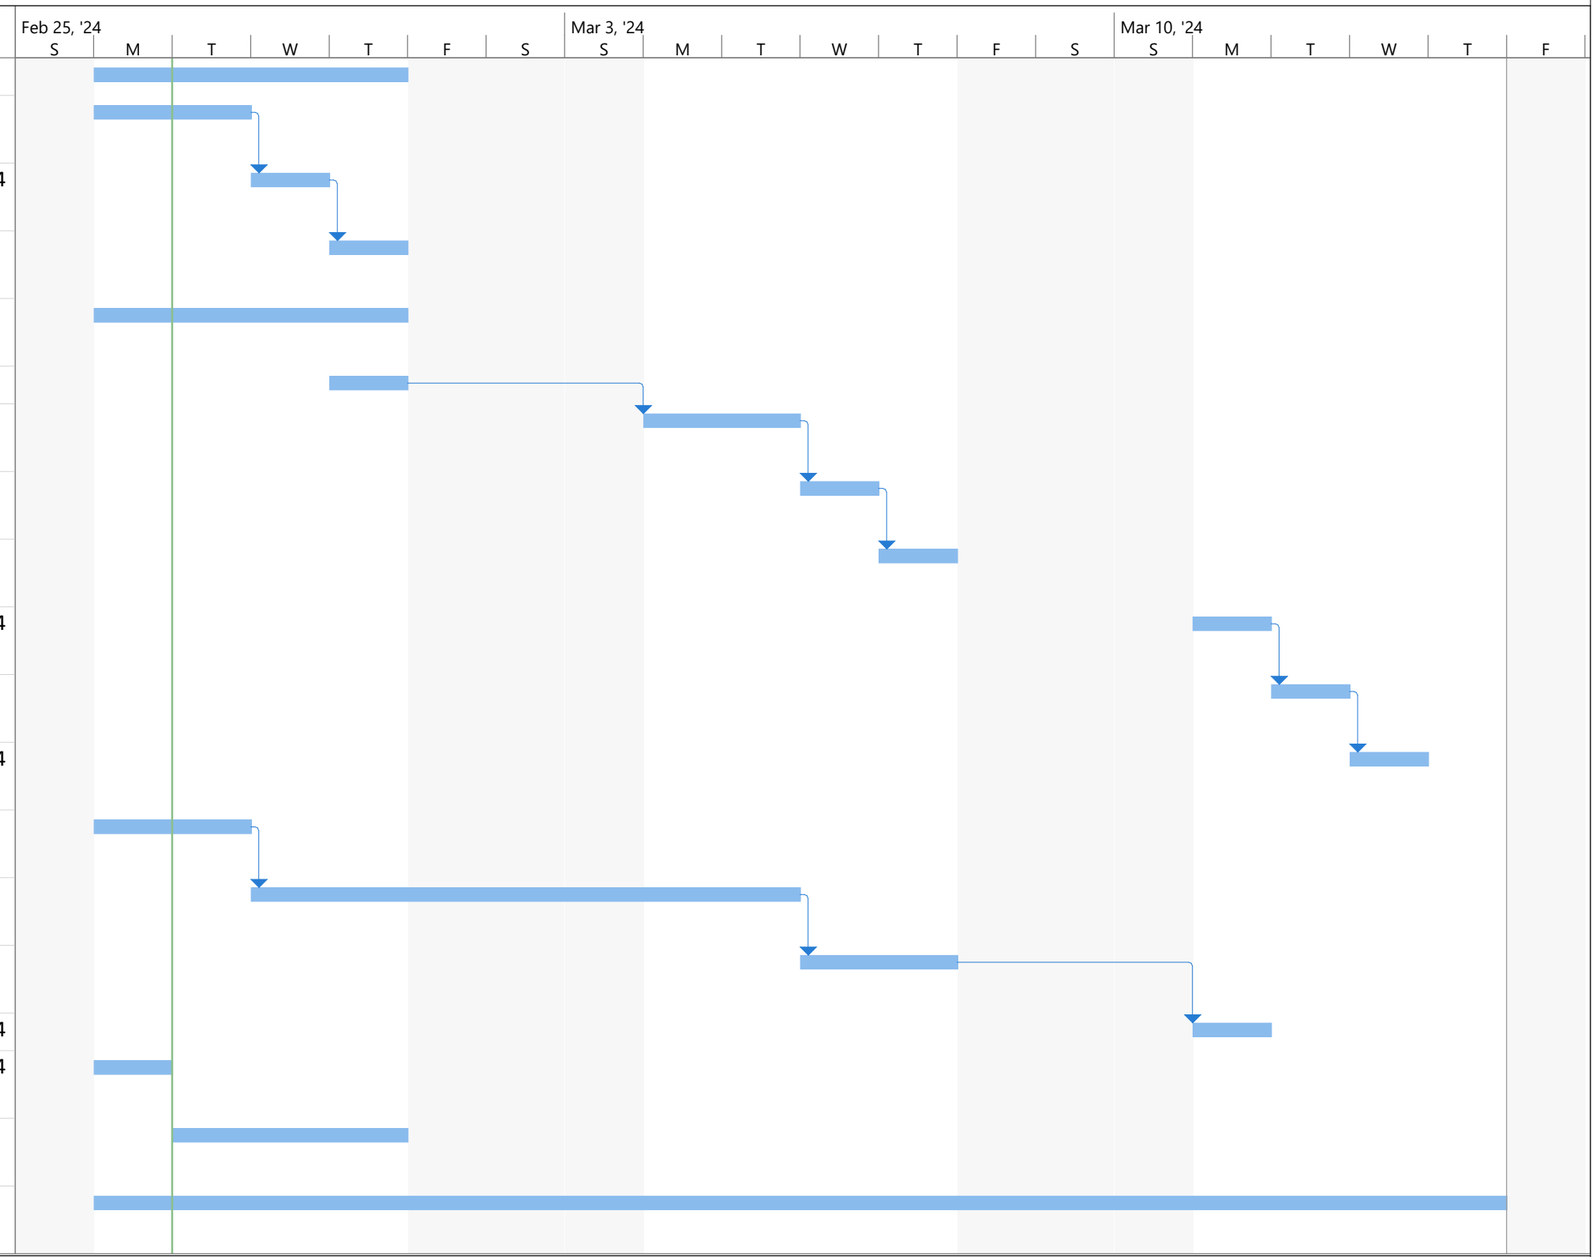
ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Concrete Curing Period - Level 3	4 days	Mon 2/26/24	Thu 2/29/24
2	Underside Repairs - Level 3 - Demo (W.I. 4.1, 4.2)	2 days	Mon 2/26/24	Tue 2/27/24
3	Underside Repairs - Level 3 - Rebar (W.I. 4.1, 4.2)	1 day	Wed 2/28/24	Wed 2/28/24
4	Underside Repairs - Level 3 - Pour (W.I. 4.1, 4.2)	1 day	Thu 2/29/24	Thu 2/29/24
5	Sealant Work - Level 2/3 (W.I. 11.1, 11.2, 11.4)	4 days	Mon 2/26/24	Thu 2/29/24
6	Remove Shoring - Level 3	1 day	Thu 2/29/24	Thu 2/29/24
7	Entrance Concrete Repairs - Level 2 - Demo (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	2 days	Mon 3/4/24	Tue 3/5/24
8	Entrance Concrete Repairs - Level 2 - Rebar/Prep (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	1 day	Wed 3/6/24	Wed 3/6/24
9	Entrance Concrete Repairs - Level 2 - Pour/Clean (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	1 day	Thu 3/7/24	Thu 3/7/24
10	Entrance Concrete Repairs - Level 3 Walkway - Demo (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	1 day	Mon 3/11/24	Mon 3/11/24
11	Entrance Concrete Repairs - Level 3 Walkway - Rebar/Prep (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	1 day	Tue 3/12/24	Tue 3/12/24
12	Entrance Concrete Repairs - Level 3 Walkway - Pour/Clean (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	1 day	Wed 3/13/24	Wed 3/13/24
13	Column Repair - Level 1 - Shoring (W.I. 6.6, 6.7)	2 days	Mon 2/26/24	Tue 2/27/24
14	Column Repair - Level 1 - Demo (W.I. 6.6, 6.7)	4 days	Wed 2/28/24	Tue 3/5/24
15	Column Repair - Level 1 - Rebar (W.I. 6.6, 6.7)	2 days	Wed 3/6/24	Thu 3/7/24
16	Column Repair - Level 1 - Pour (W.I. 6.6, 6.	1 day	Mon 3/11/24	Mon 3/11/24
17	Fleet St Stair Tower - Level 3 Landing - Pour/Clean (W.I. 41.2)	1 day	Mon 2/26/24	Mon 2/26/24
18	Fleet St Stair Tower - Level 2/3 Landing Repair (W.I. 41.2)	3 days	Tue 2/27/24	Thu 2/29/24
19	Sealant Work - Level 4 (W.I. 11.1, 11.2, 11.5) - Weather Dependent	12 days	Mon 2/26/24	Thu 3/14/24
